

# Deelproject: Ontharding en vergroening Campus Redingenhof

## Projectbeschrijving en onthardingsplan (versie november 2021)

### Ontwerp van het landschap

Plant- en houtgoed werkt aan een ontwerp voor het landschap van de speelplaats. Het landschap wordt onderverdeeld in verschillende deelprojecten die telkens in een verschillende fase aangepakt worden.

- ➔ Visie op lange termijn, zorgt voor coherent geheel.
- ➔ Opdelen in deelprojecten
- ➔ Deelprojecten in detail ontwerpen (ism leerlingen, leerkrachten, buurt)
- ➔ Budget opstellen voor elk deelproject → Financiering per deelproject (project ontharding, school, subsidies)
- ➔ Timing opstellen per deelproject.

#### Financiering ontwerp

- ✓ Aanvraag subsidie Groenplaats Stad Leuven.

#### Fasering (zie bijlage)

Fase 1: Plaatsing zitmeubel speelplaats bovenbouw + aanplanting hagen fitness en fietsenparking

Fase 2: Ontwerp en aanleg speelplaats Middenschool

Fase 3: Ontwerp en aanleg speelplaats Bovenbouw

Fase 4: Ontwerp en aanleg straatkant

#### Timing

- ✓ November 2020: ruwe schets van ontwerp
- ✓ December 2020 – Februari 2021: uitvoeren fase 1
- ✓ Januari – februari 2021: uitwerking 1<sup>e</sup> versie ontwerp landschap door Plant- en houtgoed (bespreking week 25/1)
- ✓ Februari 2021: Voorleggen plannen directie (datum te beslissen) → 8/2
- ✓ Feb - Maart 2021: Toonmoment plannen aan projectgroep ontharding
- ✓ Juni 2021: Bespreken voorontwerp fase 2 met leerlingenraad Middenschool
- ✓ September – oktober 2021: uitwerking 2<sup>e</sup> versie ontwerp landschap door Plant- en Houtgoed
- ✓ November 2021– april 2022: uitwerking fase 2
- ✓ Januari – november 2022: uitwerking fase 3

### Fase 1: uitgevoerd

#### Inhoud

- ✓ Aanplanting haag rond buitenfitness: scheiding speelplaats – parking
- ✓ Zit/hang-meubel aan fitness
- ✓ Ontharding rond fietsenparking voor school
- ✓ Aanplanting klimplanten en bodembedekker rond fietsenparking
- ✓ Aanplanting groen als scheiding (brom-)fietsenparking en autoparkeerplaatsen/straat

# Deelproject: Ontharding en vergroening Campus Redingenhof

## Projectbeschrijving en onthardingsplan (versie november 2021)

### Financiering

Budget school 2020 (€11.132,12 incl. BTW)

### Timing

- ✓ December 2020: Ontharding rond fietsenparking voor school
- ✓ Maart 2021: Aanplantingen (1/3 door Plant- en houtgoed ism leerling Plant- en Dier OV2 en OV4 Woudlucht olv Tom Pauwels)
- ✓ Februari 2021: Zit/hangmeubel

### Totale ontharding

15m<sup>2</sup>

### Extra

Sensibilisering op school: Aanplanting wordt gekoppeld aan Dikke Truiendag 1/3: 'Frisgroen'

*Zorgen voor minder beton en meer planten, struiken of bomen verhoogt de biodiversiteit. Groenvoorziening en ruimte voor waterpartijen heeft bovendien een positief effect op de gevolgen van de klimaatverandering in een bebouwde omgeving, het werkt prima tegen 'hittestress'. Met het begrip 'frisgroen' zet Dikketruiendag de functies van groen in de kijker.*

*Frisgroen zorgt namelijk voor koelte en schaduw bij hittepieken, en zorgt er ook voor dat water beter vastgehouden wordt bij droogte. Daarnaast zorgt een levende bodem voor betere en gecontroleerde infiltratie bij hevige regenval.*

## Fase 2

### Inhoud

- ✓ Invulling landschap speelplaats Middenschool
- ✓ Ontharding speelplaats Middenschool
- ✓ Participatietraject met leerlingen Middenschool: ontwerpen en invulling van deelprojecten op speelplaats MS

### Geraamd budget

€48.000

### Financiering

- ✓ Projectgroep 'Ontharding Redingenhof': €20 000
- ✓ Budget school 2020: €10.000
- ✓ Budget school 2021: €5000
- ✓ Subsidie 'Natuur op school' Provincie Vlaams Brabant: €10 000
- ✓ Subsidie Groenplaats Stad Leuven: €3000

### Timing

- ✓ Juni 2021: Bespreken voorontwerp fase 2 met leerlingenraad Middenschool

# Deelproject: Ontharding en vergroening Campus Redingenhof

## Projectbeschrijving en onthardingsplan (versie november 2021)

De aanleg was gepland voor augustus 2021, maar door vertragingen op een andere werf is de aannemer, aangesteld door Plant- en Houtgoed om de onthardingswerken uit te voeren, niet kunnen starten en werd alles uitgesteld tot het najaar van 2021.

- ✓ September – november 2021 uitwerking fase 2: deelprojecten, prioriteiten, budgettering per deelproject, participatieproject
- ✓ December 2021: uitvoeren onthardingswerken fase 2
- ✓ Januari – april 2022: aanleg speelplaats Middenschool

Totale ontharding

Geschat op 450 m<sup>2</sup>

Soortenlijst

Wordt nog toegevoegd na oktober 2021

### Fase 3

Inhoud

- ✓ Invulling landschap speelplaats Bovenbouw
- ✓ Ontharding speelplaats Bovenbouw
- ✓ Participatietraject met leerlingen Bovenbouw: ontwerpen en invulling van deelprojecten op speelplaats bovenbouw

Geraamd budget

Nog te bepalen

Financiering

- ✓ Budget school: nog te bepalen
- ✓ Subsidie 'Natuur op school' Provincie Vlaams Brabant: €10 000 (x2)
- ✓ Subsidie Groenplaats Stad Leuven: €3000

Timing

- ✓ Januari – juni 2022: uitwerking fase 3: deelprojecten, prioriteiten, budgettering per deelproject, participatieproject
- ✓ Juli-augustus 2022: ontharding speelplaats Bovenbouw
- ✓ September – november 2022: aanleg speelplaats bovenbouw

Totale ontharding

Geschat op 508 m<sup>2</sup>

Soortenlijst

Wordt nog toegevoegd na oktober 2021

### Fase 4

Inhoud

# Deelproject: Ontharding en vergroening Campus Redingenhof

## Projectbeschrijving en onthardingsplan (versie november 2021)

- ✓ Vernieuwen groen straatkant (ifv biodiversiteit en aansluiting met buurt)

Budget, financiering en budget

- ✓ Nog te bepalen

## Bijlagen

### Ontharding fase 1




### Aanplantingen fase 1



Ontwerp zit/hangmeubel (Plant- en houtgoed)

# Deelproject: Ontharding en vergroening Campus Redingenhof

## Projectbeschrijving en onthardingsplan (versie november 2021)

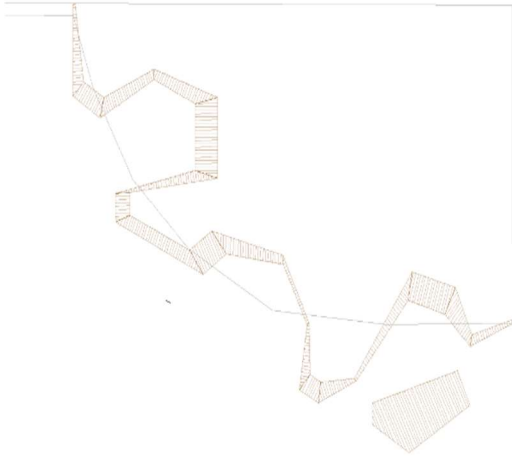

### Ontwerp landschap

De oppervlaktes die onthard zullen worden, zijn aangeduid in het groen. Elke ontharde oppervlakte vormt een deelproject dat in samenwerking met de leerlingen, leraren en buurt een invulling zal krijgen.

# Deelproject: Ontharding en vergroening Campus Redingenhof

## Projectbeschrijving en onthardingsplan (versie november 2021)

